



Beste mensen,

Bunnik, 8-9-2019

Het is lang geleden dat jullie iets van ons gehoord hebben over de muurkas, om precies te zijn was dat 6 december.

Er was al die tijd weinig nieuws te melden, al heeft het traject niet helemaal stilgelegen. In deze nieuwsbrief leggen we uit wat er is gedaan en waarom het zo lang geduurd heeft.


Aanpassen tekening

Juni 2018 was de tekening van de architect klaar. Op basis hiervan zijn diverse offertes aangevraagd en is een begroting gemaakt. Deze bleek te duur uit te pakken; rond de 100.00 euro. De verwachting van de Stichting Historische Moestuinen Landgoed Amelisweerd was dat ze dit nooit bij elkaar zouden krijgen door fondsenwerving.

Daarnaast konden we in het najaar eigenaar worden van een oud Belgisch kasdek. Deze oude kassen hadden vrijwel altijd een houten spantenconstructie.

Om bovenstaande redenen hebben we besloten de dragende constructie van hout te maken in plaats van staal. Hout betekent tevens dat we meer werk zelf kunnen doen om de kosten te drukken.

Gevolg was natuurlijk dat de tekening aangepast moest worden; de draagkracht van houten spanten is minder dan van stalen spanten. Hier is de architect een paar maanden mee bezig geweest, mede omdat het niet eenvoudig bleek iemand te vinden die de constructieberekeningen voor houten spanten kon maken.

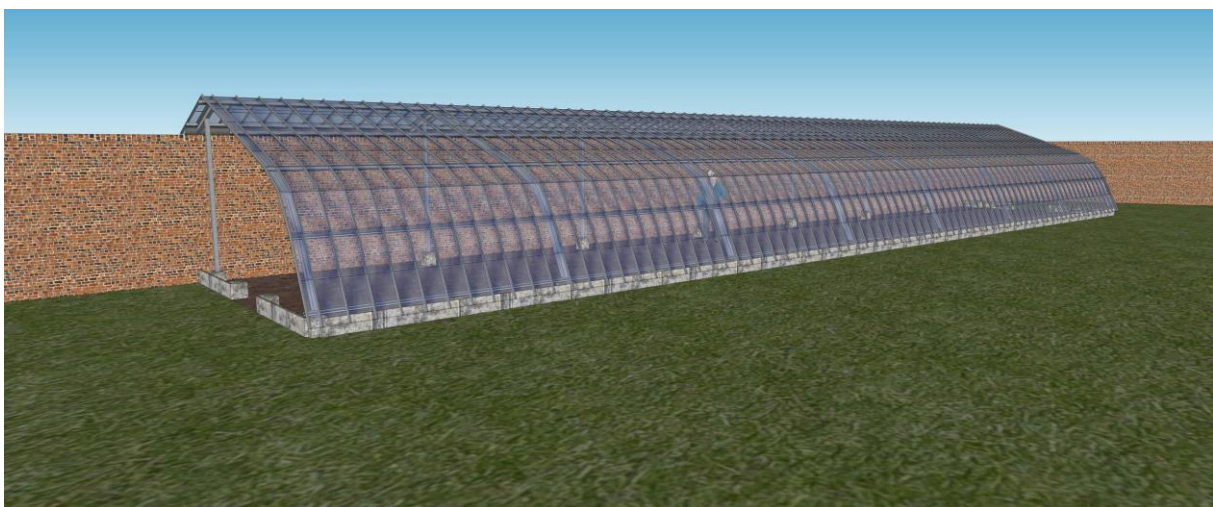

3-d impressie van de muurkas. Hier weliswaar nog op basis van stalen spanten, maar het geeft een aardige indruk.



Begroting vertraagd

Begin april, vlak nadat we eindelijk de aangepaste tekening ontvingen en op basis daarvan met de begroting aan de slag wilden gaan, brak in het huis van Gertjan -een monumentale boerderij- een grote brand uit. V eel schade, een verhuizing en enorm veel regelwerk waren het gevolg. Hierdoor is er maandenlang niets terecht gekomen van een begroting voor de kas.

Inmiddels zijn we er, notabene met hulp van de aannemer die het afgebrande pand gaat restaureren, eindelijk aan toe gekomen een begroting te maken voor de muurkas. De totale begroting komt nu op 88.000 euro, niet eens heel veel minder dan de eerder begrote ton, maar het goede nieuws is dat we hiervan naar schatting zelf zo'n 33.000 euro kunnen inbrengen in de vorm van arbeid.

Donaties

Daarnaast hebben we bijna 11.000 euro aan donaties mogen ontvangen! We hoeven dus maar de helft van het bedrag aan fondsen te werven. Donaties zijn mede belangrijk omdat dit de grote fondsen laat zien dat wij zelf al ons best hebben gedaan om financiering te vinden  n dat anderen vertrouwen hebben in ons project. We zijn dan ook ontzettend blij met de grote en kleine bedragen die we hebben mogen ontvangen.

Fondsen en vergunningen

Met een gedegen begroting kan eindelijk de Stichting aan de slag: financiering aanvragen bij fondsen en een vergunning aanvragen bij de gemeente Bunnik. Bij grotere projecten hebben we als tuinderij altijd te maken met twee gemeenten: we vallen onder de gemeente Bunnik, waar we dus de vergunning zullen aanvragen, maar de gemeente Utrecht is eigenaar van het landgoed inclusief de moestuin en moet dus ook overal toestemming voor geven. Toestemming van de gemeente Utrecht hebben we al, maar ook met "Utrecht" zullen we zeker in gesprek blijven gedurende het hele traject.

Met vriendelijke groeten,
Gertjan Ankersmit en Mieke Bald e
Tuinderij De Volle Grond



Dit is de enige bekende foto van de muurkas die op de tuin van Nieuw Amelisweerd gestaan heeft. Hij dateert uit ca 1916 en laat ons Tuinder Holl met zijn zoon in de druivenkas zien. De foto ontvingen we van de kleinzoon van tuinder Holl.
